

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
FONDO :
DEPENDENCIA EJECUTORA :

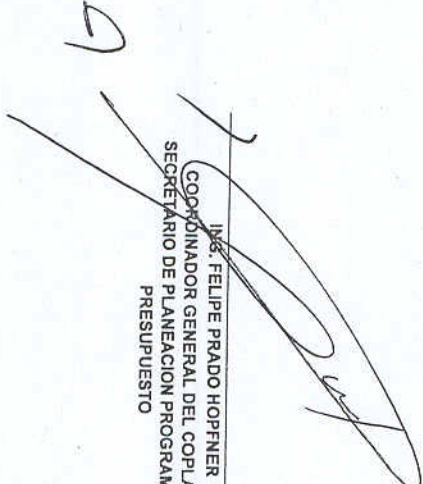
RAMO XXXIII : APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III, APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA ELABORACION 8-Ene-2010

CLAVE PROGRAMA	TOTAL	FEDERAL	APROBADO				TOTAL	FEDERAL	EJERCIDO				TOTAL	FEDERAL	SALDOS			
			ESTATAL		BENEFIC.	OTROS			ESTATAL		BENEFIC.	OTROS			ESTATAL		BENEFIC.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33		
09 CAMINOS RURALES	30,216,598			30,216,598		17,287,911			17,287,911			12,928,687			12,928,687			
06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	13,586,280			13,586,280		13,128,230			13,128,230			458,050			458,050			
Suma de la Hoja	43,802,878			43,802,878		30,416,141			30,416,141			13,386,737			13,386,737			
Subtotal	43,802,878			43,802,878		30,416,141			30,416,141			13,386,737			13,386,737			
Total	43,802,878			43,802,878		30,416,141			30,416,141			13,386,737			13,386,737			

NUM. HOJA: 1 DE 1


ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


ING. FELIPE PRADO HOPFNER
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE Y
SECRETARIO DE PLANEACION PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO: APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES

FECHA ELABORACION: 08-Ene-10
NUM. DE HOJA 1 DE 1

Cuenta Contable	No. de Obra	No. de Aprobación	Sub Pro	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. de Elec.	Fechas de		Total	Aprobado			Ejercido			Saldos			Metas Prog			Observaciones								
							Inicio (Año)	Termin (Año)		Estatal	Ramo 31	Benefic.	Otros	Total	Federal	Estatal	Ramo 31	Benefic.	Otros	Total	Federal		Estatal	Ramo 31	Benefic.	Otros	U.M.	Cant.	Alcan. Fisic. de	% Avance Fisic. Final
60.356101-09	2009/FISE-21001-PR	COP-DR-R33	093	CONSERVACION MAJOR DEL CAMINO NAVARRETE-EL PAPALOTE DEL 0+000 AL 15+500 (COMPLEMENTO)	SANTIAAGO ICQUINTLA VARIAS	C	01-Ene-08	20-Ene-09	1,150,020	1,150,020			1,121,382		28,638												* COMPLEMENTO EN FISE 2008 Y SALDOS 2006 INICIADA EL 03/05/08			
60.356101-09	2009/FISE-21001-PR	COP-DR-R33	093	CONSERVACION MAJOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARRITERO FEDERAL NO. 15 MILPAS VIEJAS (AJUSTE DE COSTOS)	TECUALA VARIAS	C	01-Abr-09	15-Abr-09	990,149	990,149			990,149		-0															
60.356101-09	2009/FISE-21001-PR	COP-DR-R33	093	CONSERVACION MAJOR DEL CAMINO NAVARRETE-PAPALOTE DEL KM 0+000 AL 15+500 (AJUSTE DE COSTOS AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2008)	SANTIAAGO ICQUINTLA VARIAS	C	01-Jun-09	30-Jun-09	1,503,692	1,503,692			1,503,692		-0														REFERENDO PARA \$12,799,834 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO	
60.356101-09	2009/FISE-21001-PR	COP-DR-R33	093	PAYMENTACION DE CAMINO TIPO C/E C. TLUXPAN-SANTA CRUZ/ EMBARCADERO ISLA DE MEXCALITLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+246.3(PRIMERA ETAPA)	VARIOS VARIAS	C	07-Oct-09		26,116,943	26,116,943			13,317,109		12,799,834													REFERENDO PARA \$28,857.49		
60.356101-09	2009/FISE-21001-PR	COP-DR-R33	093	ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y SEGUIMIENTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" EN TLUXPAN SANTA CRUZ, EMBARCADERO ISLA DE MEXCALITLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+246.4	VARIOS VARIAS	C	26-Sep-09		455,794	455,794			355,578		100,216													REFERENDO PARA 2010 \$97,010 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO POR AMORTIZAR \$28,857.49		
SUMA DE LA HOJA									30,216,598	30,216,598			17,287,911		12,928,687															
SUBTOTAL									30,216,598	30,216,598			17,287,911		12,928,687															
TOTAL									30,216,598	30,216,598			17,287,911		12,928,687															

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. FELIPE RADO HOPFNER
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE Y SECRETARIO DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

